INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE

CAHIER DES CHARGES D'AVANT-PROJET

Action Humanitaire à Pongo-Songo

Construction d'une École Primaire et Formation à l'Hygiène

Code Projet : PONGO-2026-ECO-001

Date de Création : Novembre 2025

Statut : Avant-Projet

Contributeurs au projet

Morgan Soupama
Martin Bretecher
Anthony Laï-Hong-Ting
Victor Piaget
Maël Ricouard
Arno Loustalot

Table des matières

1 IDENTIFICATION DU PROJET 3
1.1 Fiche-Projet (Carte d'Identité du Projet) 3

2 CONTEXTE ET JUSTIFICATION 3
2.1 Nature Exacte de l'Action Humanitaire 3
2.2 Raison d'Être 3
2.3 Bénéficiaires Directs et Indirects 3
2.3.1 Bénéficiaires Directs 3
2.3.2 Bénéficiaires Indirects 4

3 TYPE D'INTERVENTION 4
3.1 Description de l'Intervention 4
3.1.1 VOLET 1 : Infrastructure et Équipements 4
3.1.2 VOLET 2 : Formation des Ressources Humaines 4
3.1.3 VOLET 3 : Programme de Sensibilisation à l'Hygiène et Santé . . . 4
3.2 Type d'Intervention Générique 4

4 PORTÉE ET DURÉE DU PROJET 5
4.1 Portée Géographique 5
4.2 Portée Thématique 5
4.3 Durée du Projet et diagramme Gantt 5
4.4 Budget Prévisionnel Global 6

5 FINALITÉ ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES 6
5.1 Finalité du Projet 6
5.1.1 Vision 6
5.1.2 Mission 6
5.2 Objectifs Stratégiques 6

6 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS (SMART) 7
6.1 Objectifs SMART 7

7 ANALYSE SWOT 7
7.1 Forces (Atouts internes) 7
7.2 Faiblesses (Limitations internes) 8
7.3 Opportunités (Facteurs externes positifs) 8
7.4 Menaces (Risques externes) 8

8 PARTIES PRENANTES ET RÔLES 8
8.1 Matrice des Parties Prenantes 8

9 RISQUES MAJEURS ET STRATÉGIES DE MITIGATION 9
9.1 Tableau d'Identification des Risques 9

10 WBS (Work Breakdown Structure) 9
10.1 Structure Hiérarchique du WBS 9
10.2 Détail des Phases et Composantes 10
10.3 Synthèse par Phase 10

10.4 Matrice Sommaire WBS - Coûts et Responsabilités 10

11 Matrice RACI 11
11.1 Matrice RACI Projet Pongo-Songo 11
11.2 Synthèse des Rôles par Personne 11

12 CRITÈRES DE SUCCÈS ET INDICATEURS 12
12.1 Critères de Succès 12
12.2 Indicateurs de Performance 12

13 HYPOTHÈSES DE PROJET 12

14 Calendrier Synthétique (Jalons Majeurs) 13

15 PROCHAINES ÉTAPES 13

1 IDENTIFICATION DU PROJET

1.1 Fiche-Projet (Carte d'Identité du Projet)

Titre du Projet	Construction d'une École Primaire et Sensibilisation à l'Hygiène à Pongo-Songo
Code Projet	PONGO-2026-ECO-001
Chef de Projet	Morgan Soupama
Commanditaire	ONG Humanitaire Partenaire (fictive)
Date de Lancement	15 janvier 2026
Date Prévue de Fin	31 décembre 2026
Durée Totale	12 mois
Budget Estimé	650 000 EUR

2 CONTEXTE ET JUSTIFICATION

2.1 Nature Exacte de l'Action Humanitaire

L'action humanitaire à Pongo-Songo porte sur la **construction d'une école primaire communautaire** et la **mise en place d'un programme de sensibilisation à l'hygiène et à la santé préventive**.

2.2 Raison d'Être

Pongo-Songo est un petit village situé dans une région rurale d'Afrique subsaharienne (région fictive du Cameroun), avec une population d'environ 5 000 habitants.

Actuellement, les enfants du village n'ont accès à aucune structure scolaire formelle, ce qui limite drastiquement leurs perspectives d'avenir. Parallèlement, le manque de sensibilisation aux règles élémentaires d'hygiène génère des problèmes récurrents de santé publique :

— Maladies infectieuses chroniques

— Malnutrition infantile

— Problèmes d'approvisionnement en eau potable

— Conditions d'assainissement insuffisantes

2.3 Bénéficiaires Directs et Indirects

2.3.1 Bénéficiaires Directs

— **900 enfants** (âgés de 5 à 12 ans) du village et des hameaux environnants

— **35 habitants** formés comme futurs « animateurs d'hygiène » communautaire

— **6 instituteurs** issus de la communauté (recrutés et formés dans le cadre du projet)

2.3.2 Bénéficiaires Indirects

— L'ensemble de la communauté de Pongo-Songo (5 000 habitants) via l'accès à l'éducation et l'amélioration des conditions sanitaires
— Les familles des enfants scolarisés
— Les autorités locales qui bénéficient d'une amélioration du développement social du territoire

3 TYPE D'INTERVENTION

3.1 Description de l'Intervention

Le projet s'articule autour de trois volets interdépendants :

3.1.1 VOLET 1 : Infrastructure et Équipements

— Construction d'une école primaire modulaire (4 salles de classe pour démarrage)
— Aménagement d'une cantine scolaire
— Mise en place de points d'eau potable (3 puits équipés de pompes manuelles)
— Installation de toilettes hygiéniques séparées (garçons/filles)
— Électrification solaire de l'école
— Mobilier et matériel pédagogique (tableaux, bureaux, livres)

3.1.2 VOLET 2 : Formation des Ressources Humaines

— Recrutement et formation de 6 enseignants titulaires
— Formation de 12 « ambassadeurs d'hygiène » communautaires
— Formation des gestionnaires de l'école (directeur, secrétaire, maintenance)
— Renforcement des capacités en gestion administrative et financière

3.1.3 VOLET 3 : Programme de Sensibilisation à l'Hygiène et Santé

— Élaboration de module pédagogique sur l'hygiène (intégré aux cours)
— Sensibilisation mensuelle des habitants (parents, travailleurs agricoles)
— Mise en place d'une clinique de santé scolaire mobile
— Formation aux gestes barrière et prévention des maladies infectieuses
— Suivi nutritionnel des enfants et distribution de vitamines

3.2 Type d'Intervention Générique

Classification : Projet de développement socio-éducatif avec volet santé préventive
Approche : Intervention mixte combinant :
— Construction d'infrastructure (génie civil)
— Renforcement des capacités (ressources humaines)
— Sensibilisation et changement de comportement (santé publique)

4 PORTÉE ET DURÉE DU PROJET

4.1 Portée Géographique

— **Zone d'intervention principale :** Pongo-Songo (village pilote)

— **Zone d'influence étendue :** Trois hameaux satellites à 5-8 km de Pongo-Songo

— **Rayon de couverture :** Environ 15 km² desservant une population de base de 5 000 habitants et potentiellement 8 000 habitants dans les zones environnantes

4.2 Portée Thématique

— **Secteurs :** Éducation primaire, santé publique, hygiène et assainissement

— **Groupes ciblés :** Enfants (5-12 ans), femmes, agriculteurs, autorités locales

— **Nombre de bénéficiaires finaux :** 5 000 personnes (direct) + 8 000 (indirect)

4.3 Durée du Projet et diagramme Gantt

L'avant projet s'organise sur une période d'un mois comme le démontre le diagramme Gantt suivant :

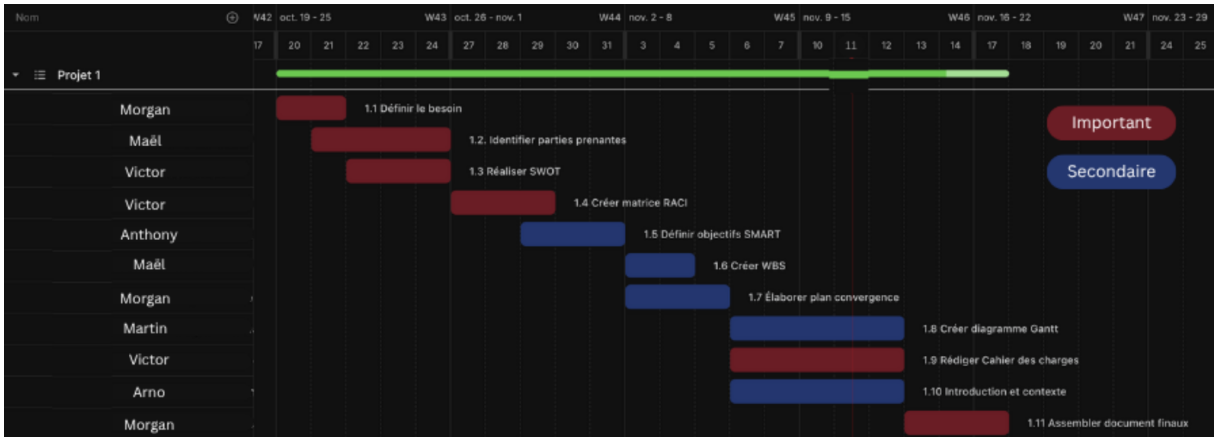


FIGURE 1 – Diagramme Gantt de l'avant-projet

Le projet en lui-même aura une durée de 12 mois divisés en 4 phases majeures.

Phase	**Période**	**Durée**	**Mois**
Phase 1 : Lancement et étude site	15 janv - 15 février 2026	1 mois	1
Phase 2 : Construction et mise en place	16 février - 31 juillet 2026	5,5 mois	5
Phase 3 : Formation et démarrage	1 août - 30 novembre 2026	4 mois	4
Phase 4 : Transfert et clôture	1 décembre - 31 décembre 2026	1 mois	1
	TOTAL	**12 mois**	**12**

Les 4 phases ont été réparties sur le diagramme Gantt suivant :

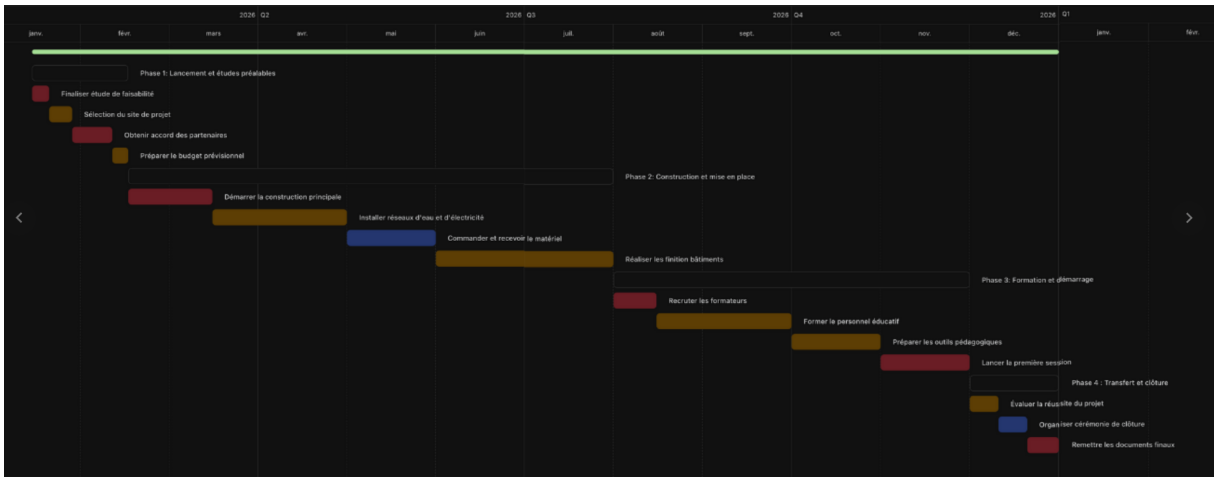


FIGURE 2 – Diagramme Gantt du Projet

4.4 Budget Prévisionnel Global

Budget total estimé : 650 000 EUR

Poste de dépense	**Montant (EUR)**	**%**
Travaux de construction	280 000	43%
Équipements et mobilier	95 000	15%
Formation des ressources humaines	85 000	13%
Programme d'hygiène/santé	65 000	10%
Frais de gestion et coordination	75 000	12%
Imprévus (10%)	55 000	7%
TOTAL	**650 000**	**100%**

5 FINALITÉ ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

5.1 Finalité du Projet

5.1.1 Vision

Permettre aux enfants de Pongo-Songo d'accéder à une éducation de qualité dans un environnement sain et hygiénique, favorisant leur développement personnel et leur intégration sociale et économique future.

5.1.2 Mission

Construire une infrastructure scolaire durable, former les ressources humaines locales et installer une culture d'hygiène et de prévention sanitaire au sein de la communauté.

5.2 Objectifs Stratégiques

OS1 - Objectif d'accès à l'éducation :
Assurer que 100% des enfants de Pongo-Songo et des zones environnantes âgés de 5-12 ans aient accès à une éducation primaire de qualité d'ici juin 2026.

OS2 - Objectif de qualité éducative :
Former une équipe pédagogique compétente et motiver 95% des enfants scolarisés à rester à l'école durant au moins 2 ans (rétention scolaire).

OS3 - Objectif de santé et hygiène :
Réduire de 60% les maladies d'origine hydrique et alimentaire chez les enfants de Pongo-Songo en 12 mois.

OS4 - Objectif de durabilité :
Construire les capacités locales pour que l'école soit autosuffisante et opérationnelle de manière durable sans assistance extérieure dans 3 ans.

6 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS (SMART)

6.1 Objectifs SMART

O1 : Construire une école primaire de 4 salles de classe, capable d'accueillir 200 enfants par session pédagogique, d'ici le 31 juillet 2026, conformant aux normes de sécurité locales et avec un taux de conformité inspectée de 100%.

O2 : Former et recruter 6 enseignants titulaires et 2 assistants pédagogiques complètement formés et certifiés avant le 31 août 2026, avec une évaluation des compétences minimales attestée.

O3 : Enrôler au minimum 800 enfants (dont 50% de filles) dans les 3 mois suivant l'ouverture, avec un taux de présence mensuelle moyenne de 85% maintenu pendant 6 mois.

O4 : Réduire l'incidence des maladies gastro-entériques chez les enfants scolarisés de 60% en 12 mois, mesurée par un suivi médical trimestriel documenté.

O5 : Mettre en place une structure de gestion locale autonome (comité de gestion, système comptable, plan d'maintenance) avant le 30 novembre 2026, capable de gérer le budget opérationnel sans assistance.

O6 : Former 35 « ambassadeurs d'hygiène » (au moins 50% de femmes) capables de sensibiliser 80% de la communauté aux règles d'hygiène basique dans les 6 mois suivant leur formation.

7 ANALYSE SWOT

7.1 Forces (Atouts internes)

— **Forte implication de la communauté :** Les habitants de Pongo-Songo participent activement aux assemblées et aux décisions

— **Disponibilité d'une ressource foncière :** Le terrain pour l'école a été généreusement donné par la communauté

— **Expertise du partenaire ONG :** Expérience de 15 ans en projets éducatifs en Afrique subsaharienne

— **Stabilité politique locale :** Zone considérée comme stable politiquement

7.2 Faiblesses (Limitations internes)

— **Faible capacité financière locale :** Les habitants ne peuvent pas contribuer au-delà de la main-d'œuvre

— **Manque de ressources humaines qualifiées :** Difficulté à recruter des enseignants ayant une formation supérieure

— **Accès routier limité :** Pongo-Songo est accessible uniquement par une route de terre (mauvaise qualité)

— **Faible infrastructure énergétique :** Pas d'électricité conventionnelle disponible

7.3 Opportunités (Facteurs externes positifs)

— **Soutien gouvernemental :** Le gouvernement camerounais promeut l'éducation rurale (politiques Pro-EDM)

— **Partenariats potentiels :** Autres ONG actives dans la région pourraient co-financer certains volets

— **Accès au marché du travail futur :** Les enfants auront de meilleures opportunités d'emploi

— **Effets de réseau :** Le succès à Pongo-Songo peut servir de modèle pour d'autres villages

7.4 Menaces (Risques externes)

— **Instabilité climatique :** Risque de fortes pluies endommageant l'infrastructure en construction

— **Conflits communautaires localisés :** Tensions foncières liées aux terres du projet

— **Fluctuation des prix de la construction :** Augmentation des coûts de matériaux

— **Risque sanitaire :** Épidémies affectant la disponibilité du personnel et des bénéficiaires

— **Durabilité du financement :** Risque de manque de fonds pour l'opération post-projet

8 PARTIES PRENANTES ET RÔLES

8.1 Matrice des Parties Prenantes

Partie Prenante	**Rôle**	**Intérêt/Enjeu**	**Influence**
Communauté locale	Bénéficiaire, contributeur	Accès éducation, emplois	Haut
Autorités locales	Facilitateur, validateur	Développement territorial	Haut
ONG Partenaire	Maître d'ouvrage, coordonnateur	Succès du projet	Haut
Ministère Éducation	Régulateur, accréditation	Respect normes éducatives	Moyen-Haut
Bailleurs de fonds	Financeurs	ROI, impact social	Haut
Enseignants locaux	Exécutants, bénéficiaires	Emploi stable, formation	Moyen
Parents d'élèves	Demandeurs, responsables	Accès école, qualité	Haut
Entreprise constructeur	Prestataire technique	Contrat, paiement	Moyen
Associations féminines	Partenaires sensibilisation	Amélioration santé	Moyen

9 RISQUES MAJEURS ET STRATÉGIES DE MITIGATION

9.1 Tableau d'Identification des Risques

#	**Risque**	**Prob.**	**Impact**	**Crit.**	**Stratégie de Mitigation**
R1	Dépassement budget	M	É	Él	Appels d'offres compétitifs
R2	Retard construction	M	M	M	Clauses pénales, planning resserré
R3	Rejet communautaire	F	TÉ	M	Consultation participative continue
R4	Manque personnel qualifié	É	M	Él	Programme formation anticipé
R5	Problèmes approvisionnement	M	M	M	Contrats d'approvisionnement
R6	Crises sanitaires	F	TÉ	M	Plan de continuité, protocoles
R7	Instabilité politique	F	TÉ	M	Suivi contexte, assurance projet

Note : F=Faible, M=Moyenne, É=Élevé, TÉ=Très Élevé, Crit.=Criticité, Prob.=Probabilité, Él=Élevée

10 WBS (Work Breakdown Structure)

10.1 Structure Hiérarchique du WBS

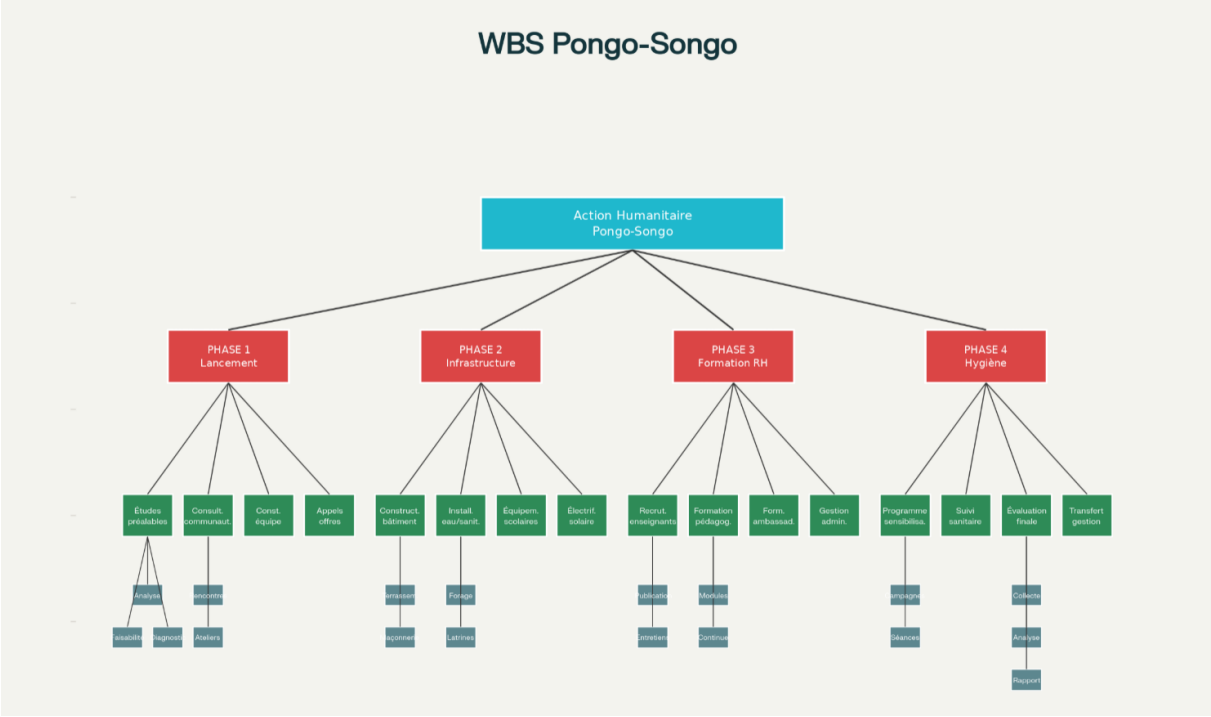


FIGURE 3 – WBS complet du projet Pongo-Songo

10.2 Détail des Phases et Composantes

Niveau 2	Niveau 3	Durée	Budget
PHASE 1 : Lancement	1.1 - Études préalables	1 sem	8 k€
	1.2 - Consultations communautaires	1 sem	5 k€
	1.3 - Constitution équipe	1 sem	8 k€
	1.4 - Appels d'offres	1 sem	9 k€
PHASE 2 : Infrastructure	2.1 - Construction bâtiment	12 sem	280 k€
	2.2 - Installation eau/sanitaires	10 sem	85 k€
	2.3 - Électrification solaire	8 sem	55 k€
	2.4 - Équipement et mobilier	6 sem	95 k€
	2.5 - Aménagement cour	4 sem	20 k€
PHASE 3 : Formation	3.1 - Formation enseignants	6 sem	35 k€
	3.2 - Formation ambassadeurs hygiène	4 sem	25 k€
	3.3 - Gestion administrative	8 sem	25 k€
	3.4 - Ouverture école	2 sem	10 k€
PHASE 4 : Clôture	4.1 - Programme hygiène communautaire	4 sem	15 k€
	4.2 - Évaluation et documentation	3 sem	12 k€
	4.3 - Transfert de gestion	2 sem	8 k€
	4.4 - Clôture administrative	1 sem	0 k€

10.3 Synthèse par Phase

Phase	Durée	Budget	Responsable
PHASE 1 : Lancement	1 mois	30 k€	Chef Projet
PHASE 2 : Infrastructure	5,5 mois	460 k€	Chef Chantier
PHASE 3 : Formation	4 mois	95 k€	Responsable RH
PHASE 4 : Clôture	1 mois	35 k€	Chef Projet
TOTAL	**12 mois**	**650 k€**	-

10.4 Matrice Sommaire WBS - Coûts et Responsabilités

Composante Principale	Durée	Budget	Responsable	Livrables
PHASE 1 : Lancement	1 mois	30 k€	Chef Projet	Équipe formée, contrats signés
PHASE 2 : Infrastructure	5,5 mois	460 k€	Chef Chantier	École, eau, sanitaires
PHASE 3 : Formation	4 mois	95 k€	Responsable RH	Personnel formé, opérationnel
PHASE 4 : Évaluation	1 mois	35 k€	Chef Projet	Rapport final, transition
TOTAL	**12 mois**	**650 k€**	-	-

11 Matrice RACI

11.1 Matrice RACI Projet Pongo-Songo

Tâches Principales	**Morgan**	**Maël**	**Victor**	**Antho**	**Martin**	**Arno**
Définir le besoin	R	A	I	C	I	I
Identifier parties prenantes	A	R	C	I	I	C
Réaliser SWOT	-	I	R	A	I	I
Créer matrice RACI	-	I	R	I	C	I
Définir objectifs SMART	C	A	I	R	I	I
Créer WBS	R	A	-	I	A	I
Élaborer plan convergence	A	R	A	I	I	C
Créer diagramme de Gantt	C	C	I	R	I	I
Rédiger Cahier des Charges	-	I	C	I	R	I
Analyser les risques	I	I	I	R	C	A
Décrire les livrables	-	-	R	A	A	I
Organiser mission terrain	I	A	I	-	I	R
Préparer vidéo présentation	A	R	I	-	I	I
Créer affiche A0	I	C	-	-	R	A
Corriger et valider CDC	I	I	C	A	R	C
Rédiger introduction contexte	R	A	-	-	C	A
Assembler documents finaux	A	-	C	-	R	I
Dépôt du projet final	R	I	I	I	A	-

11.2 Synthèse des Rôles par Personne

Membre	**Responsable**	**Acteur**	**Consulté**	**Informé**
Morgan Soupama	4 tâches	4 tâches	1 tâche	12 tâches
Maël Ricouard	3 tâches	5 tâches	3 tâches	10 tâches
Victor Piaget	4 tâches	3 tâches	1 tâche	13 tâches
Anthony Laï-Hong-Ting	2 tâches	3 tâches	1 tâche	15 tâches
Martin Bretecher	4 tâches	3 tâches	2 tâches	12 tâches
Arno Loustalot	1 tâche	3 tâches	2 tâches	15 tâches

Cette matrice garantit que :

— Chaque tâche a un responsable unique pour éviter les conflits d'autorité

— Les contributeurs sont clairement identifiés pour mobiliser les compétences

— Les acteurs clés sont consultés pour bénéficier de leurs avis

— Tous les membres restent informés de l'avancement global

12 CRITÈRES DE SUCCÈS ET INDICATEURS

12.1 Critères de Succès

- ✓ L'école est construite et certifiée aux normes par autorités locales avant le 31 juillet 2026
- ✓ 800+ enfants inscrits avec taux de présence moyen $\geq 85\%$ pendant 6 mois
- ✓ 6 enseignants formés et certifiés, évaluations positives des enfants
- ✓ Réduction maladies infectieuses de 60% attestée cliniquement
- ✓ Structure de gestion locale opérationnelle et autonome
- ✓ 35 ambassadeurs d'hygiène actifs ayant atteint 80% de la communauté
- ✓ Satisfaction des bénéficiaires $\geq 80\%$ (enquête final)
- ✓ Budget dépensé $\pm$ 10% par rapport prévisionnel

12.2 Indicateurs de Performance

Objectif	**Indicateur**	**Baseline**	**Cible**	**Fréquence**
Accès à l'éducation	Taux d'enrôlement enfants	0%	85%	Mensuelle
Qualité éducative	Score évaluation enseignants	0	75+	Trimestrielle
Réduction maladies	Cas maladies infectieuses/mois	120	48	Mensuelle
Hygiène	% habitants adopté bonnes pratiques	15%	75%	Semestrielle
Durabilité financière	Autonomie budget opérationnel	0%	60%	Trimestrielle

13 HYPOTHÈSES DE PROJET

1. H1 : La communauté locale reste engagée et participative tout au long du projet
2. H2 : Les fonds prévus sont disponibles selon le calendrier de décaissement
3. H3 : Le contexte politique et sécuritaire reste stable pendant 12 mois
4. H4 : Les matériaux de construction restent disponibles et les prix fluctuent $< 15\%$
5. H5 : Les candidats enseignants disponibles pour formation répondent critères minimums
6. H6 : L'infrastructure routière permet l'accès aux matériaux lourds (ciment, fer)
7. H7 : Les autorités locales délivrent autorisations administratives dans les 30 jours

14 Calendrier Synthétique (Jalons Majeurs)

Jalon	**Date**	**Livrables**	**Resp.**
JAL-01 : Kickoff	15 fév. 2026	Accords communautaires, équipe	Chef de Projet
JAL-02 : Fin études	15 mars 2026	Étude faisabilité, appels d'offres	Ingénieur
JAL-03 : Contrats	15 avril 2026	Contrats construction, fournitures	Admin
JAL-04 : Début construction	16 avril 2026	Fondations, ordres de service	Chef Chantier
JAL-05 : Fin gros-œuvre	30 juin 2026	Structure complète, couverture	Chef Chantier
JAL-06 : Livraison finitions	31 juillet 2026	École prête, certifiée	Chef Chantier
JAL-07 : Fin formations	31 août 2026	6 enseignants certifiés	RH
JAL-08 : Ouverture école	15 sept. 2026	800 enfants inscrits, inaugurée	Chef de projet
JAL-09 : Clôture	31 déc. 2026	Évaluation finale, transfert	Chef de projet

15 PROCHAINES ÉTAPES

1. Validation du présent Cahier des Charges par le comité de pilotage
2. Mise en place du Plan de Convergence détaillé avec jalons Go/No-Go
3. Création du diagramme de Gantt détaillé avec planification temporelle
4. Mise en place du tableau de bord de pilotage projet
5. Lancement de l'étude de faisabilité détaillée et de l'analyse fonctionnelle
